

LEGENDE

Vermeidungsmaßnahmen

- Bautabuzone in der Bauphase (zu Maßn. 7 V)
- Vegetationsschutzzaun während der Bauzeit (zu Maßn. 7 V)
- Gehölzschutz (gem. R SBB 2023 und DIN 18920) in der Bauphase (zu Maßn. 7 V)
- temporärer Schutzzaun für Zauneidechsen (Maßn. 3 V_{CEF})
- Abfangzaun für Zauneidechsen vor Baubeginn (zu Maßn. 4 V_{CEF})

Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen

- Entsiegelung (Maßn. 11 A)
- Rasenansaat (Böschung/ Mulde)
- Landschaftsrasen (zu Maßn. 13 G bzw. 14 A)
- Waldartiger Gehölzbestand (Maßn. 8 A)
- Feldhecke (Maßn. 10 A, 11 A)
- Weitere Gehölze (Maßn. 9 A, 10 A)
- Aufwertung des Zauneidchsenumsiedelhabitates durch Extensivierung (Maßn. 5 A_{CEF})
- Anlage von Zauneidchsenhabitatstrukturen (Maßn. 5 A_{CEF})
- Hochstammpflanzung (Maßn. 10 A)

Maßnahmennummer und Beschreibung

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

- 1 V_{CEF}** Baufeldfreimachung / Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel zwischen 01. Oktober und 28. Februar
- 2 V_{CEF}** Kontrolle auf besetzte Feldhamsterbaue vor Baubeginn
- 3 V_{CEF}** Abgrenzung der Umsiedlungshabitate durch Schutzzaun bis zur Eingewöhnung der Zauneidechse
- 4 V_{CEF}** Abgrenzung potentieller Zauneidchsenhabitate innerhalb des Baufeldes durch Schutzzaun, Abfang und Umsiedlung der Zauneidechsen

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

- 5 A_{CEF}** Anlage von Ersatzhabitaten für die Zauneidechsen


Vermeidungsmaßnahmen bau- bzw. anlagebedingter Beeinträchtigungen

- 6 V** Umweltbaubegleitung (gesamte Baustrecke)
- 7 V** Gehölzschutz (gem. R SBB 2023 und DIN 18920) in der Bauphase und Schutz der Bautabuzonen

Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen

- 8 A** Entwicklung von Gehölzbeständen (zur Wiederherstellung beanspruchter Maßnahmeflächen aus einem anderen Verfahren (BAB 9 Lärmschutzmaßnahmen Schleinitz, Maßnahme 2.3 A))
- 9 A** Wiederherstellung bzw. Neuanlage von Gehölzen im Baufeld
- 10 A** Neuanlage von Feldgehölzen und Hecken
- 11 A** Entsiegelung der ehemaligen Aupitzer Straße und Neuanlage einer Feldhecke
- 12 G** Ansaat von Landschaftsrasen ohne Kräuter (Bankette, Böschungen und Mulden)
- 13 G** Ansaat von standortgerechtem regionalen Wildpflanzensaatgut
- 14 A** Entwicklung einer artenreichen Mähwiese (zur Wiederherstellung beanspruchter Maßnahmeflächen aus einem anderen Verfahren (B-Plan WSF Nr. 23, 2. Änderung, Maßnahme D))

Maßnahmenkennung



Maßnahmenkennung	Erläuterung Maßnahmetyp und Index
V	Vermeidungsmaßnahme
V _{CEF}	Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
A	Ausgleichsmaßnahme
A _{CEF}	Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion
G	Gestaltungsmaßnahme

Vermeidungsmaßnahmen (Wiederherstellung des Ausgangszustandes)

- 15.1 V** Wiederherstellung einer artenreichen, frischen Mähwiese
- 15.2 V** Wiederherstellung von Acker und Grünlandflächen
- 15.3 V** Wiederherstellung von Staudenfluren

Technische Planung

- Lärmschutzwand
- Mulde (Ansaat) mit Muldeneinlauf/ Prüfschacht Bankette/ z.T. mit Schutzeinrichtung
- Wartungsweg
- Dammböschung/ Einschnittsböschung (Ansaat)
- Versickerungsmulde (Ansaat)
- Baufeldgrenze

Nachrichtlich

- Autobahn-km
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen
- Gemarkungsgrenzen
- Ausgleichsmaßnahme des Bauvorhabens "BAB 9 Berlin-München, BAB-km 160,524 bis 161,604, Ortslage Schleinitz, Lärmschutzmaßnahmen" (Maßnahme 2.3A "Entwicklung walddartiger Gehölzbestände") (Az.: 308.5.1-31027-F2.20)
- Grenze Bebauungsplan Nr. 23
- Gehölzverluste (symbolisch)
- Zuwegung (zu Maßnahme 5 A_{CEF})

Leitungen Bestand

- Glasfaser-Versorgungsanlagen (LWL-Trasse) Eigentümer: Colt Technology Services GmbH, GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, NGN Fibernetzwerk GmbH & Co. KG und Vodafone GmbH
- Mittelspannungsfreileitung der MITNETZ STROM
- Mittelspannungsleitung der MITNETZ STROM
- Fernmeldetrasse der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
- Telekommunikationsanlagen (Erdkabel) der Deutschen Telekom AG
- Telekommunikationsanlagen außer Betrieb (Erdkabel) der Deutschen Telekom AG
- Bestand Straßenentwässerung

Leitungen Planung

- Mittelspannungsleitung der MITNETZ STROM
- Anpassung Straßenentwässerung
- Glasfaser-Versorgungsanlagen (LWL-Trasse)


Hinweise:

Die eingetragenen Leitungen wurden aus dem Bestand der Versorgungsunternehmen nachrichtlich übernommen. Die Lage- und höhenmäßige Einordnung des vorhandenen Leitungsbestandes ist vor der Bauausführung in der Örtlichkeit zu überprüfen und mit den einzelnen Versorgungsträgern abzustimmen. An ausgewählten Punkten sind Suchschachtungen vorzunehmen.

Vermerk:

ALKIS © GeoBasis-DE / G01-7002757-2021

Übersicht der Blattschnitte

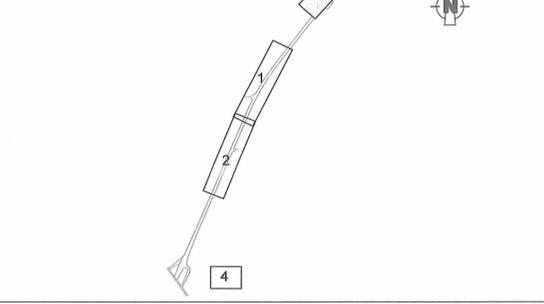

Biotoptypen

Code der Biotoptypen (gemäß BKompV, Anlage 2) (und Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt)

- 24 Stehende Gewässer**
Weitere stehende Gewässer, Offene Wasserrückhaltebecken
- 33 Äcker und Ackerbrache**
Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation, Lössboden
- 34 Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte**
Mäßig artenreiche, frische Mähwiese
- 34.08a.01** Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland
- 34.08.02** Frisches Ansaatgrünland
- 39 Wald- und Ufersäume, Staudenfluren**
Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden
- 41 Feldgehölze, Gebüsche, Hecken und Gehölzkulturen**
(Verbuschung > 50 %)
- 41.01.06** Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache
- 41.02.02M** Feldgehölz frischer Standorte, Mittlere Ausprägung
- 41.03.03J** Sonstige Hecke (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen), Junger Ausprägung
- 41.03.03M** Sonstige Hecke (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen), Mittlere Ausprägung
- 41.05bM** Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend nicht autochthonen Arten, Mittlere Ausprägung
- 41.05.05M** Obstbaumreihe, Mittlere Ausprägung
- 51 Freiflächen des besiedelten Bereichs**
51.04a.01 Brachflächen mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung
- 51.07a.02** Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand
- 51.08a.01** Kleingartenanlagen, Grabelände, Gärten und private Grünflächen, strukturreich
- 52 Verkehrsanlagen und Plätze**
52.01.01a Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z.B. Straße, Start-, Landebahn Bankette, Mittelstreifen)
- 52.01.08a.01** Funktionsgrün mit artenreicher Krautschicht oder mit Gehölzbestand junger Ausprägung
- 52.01.08a.02** Funktionsgrün mit artenreicher Krautschicht oder mit Gehölzbestand mittlerer bis alter Ausprägung
- 52.02.01a** Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Weg
- 52.02.04a** Geschotterter Weg oder Weg mit wassergebundener Decke
- 52.02.06** Unbefestigter Weg
- 52.03.01** Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz
- 52.03.03a** Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke
- 53 Bauwerke mit zugeordneter typischer Freiraumstruktur**
53.01.14a Industrie- und Gewerbefläche inkl. typischen Freiräumen
- 53.01.17a.02** Sonstiges Dorfgebiet inkl. Neubaugebiete

1	2	3	4
---	---	---	---

<p>Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Reichardtstraße 7, 06114 Halle/Saale</p>	bearbeitet	03/2023	Miehe
	freigegeben	03/2023	Hieber
	Projekt-Nr.	6597	

<p>Die Autobahn Niederlassung Ost Magdeburger Straße 51, 06112 Halle</p>	bearbeitet	03/2023	Wi.
	freigegeben	03/2023	Fritz
	Projekt-Nr.	A.14574.00	

01	Anpassung der LBP-Maßnahmen (Ergänz. Maßn. 9A, Ummummerierung der Folg.)	07/2024	Miehe
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	Gauß-Krüger 42/83 (3°), Lagestatus 150	Stand Kataster	08/2023
Höhensystem	DHHN 92, Höhenstatus 160	Bestandsvermessung	05/2016

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 3A
Maßnahmen	
Landschaftspflegerischer Begleitplan	
Straße / Abschnitt-Nr. / Station: (von - bis): BAB 9	Maßstab: 1 : 1000
PROJIS-Nr.: -	

**BAB 9, Berlin-München, km 146,50 - 149,50
Lärmschutzmaßnahmen**

aufgestellt: Halle (Saale), 31.03.2022 Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost		Planfestgestellt mit Planfeststellungsbeschluss des Fernstraßen-Bundesamtes vom 31.03.2025 Az.: P2/02-01-04-01#00062
	Geschäftsbereichsleiter Planung	
1. Deckblatt aufgestellt:		Im Auftrag gez. Ringleb
Halle (Saale), 05.07.2024 Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost	Geschäftsbereichsleiter Planung	
